Commission scolaire de Montréal

École Félix Leclerc - Agrandissement

TRAVAUX DE L'AGRANDISSEMENT ET DU GYMNASE EXISTANT

ÉCHÉANCIER RÉEL DU CHANTIER

juillet 2014	début des travaux
17 sept. 2014	debut de la construction des fondations à l'arrière de l'agrandissment
18 nov. 2014	signalement par Socam sur la stabilité de la cheminée et de son mur
28 nov. au 4 déc. 2014	démolition de la cheminée
29 avril au 22 mai 2015	démolition du mur de la cheminée
27 août au 17 sept. 2015	reconstruction du mur de la cheminée
12 - 13 mars 2016	démolition d'un mur du gymnase (empoussièrement de l'école existante)
16-17 mars 2016	arrêt et interdiction des travaux par la CNESST
16 août 2016	levée de l'interdiction de la CNESST
sept. 2016	poursuite des travaux de l'agrandissement et du vieux gymnase
11 janvier 2017	relocalisation des élèves à l'école Saint-Jean-De-La-Croix
mars 2017	annulation des travaux de la passerelle, du tunnel et de l'annexe
3 avril 2017	reception avec réserve vieux gymnase (travaux de renforcement)
fin juin 2017	fin des travaux de remblai (circulation entre les 2 bâtiments)
juillet 2017	expertise sur le nouveau gymnase
février 2018	fin des travaux de Socam (reception avec réserve)
février 2018	correction des déficiences par SOCAM
juin 2018	fin du mandat de Socam
juillet 2018	début des travaux correctifs et à compléter (Ex: toiture, revêtement métallique, cour d'école) par RG Construction Ltée
21 mai 2019	**début des travaux de la déconstruction du nouveau gymnase**
automne 2019	début de la reconstruction du nouveau gymnase

PROVENCHER_ROY Stantec sdk

mai 2019

Commission
scolaire
de Montréal

École Félix Leclerc - Agrandissement

PLAN D'ENSEMBLE

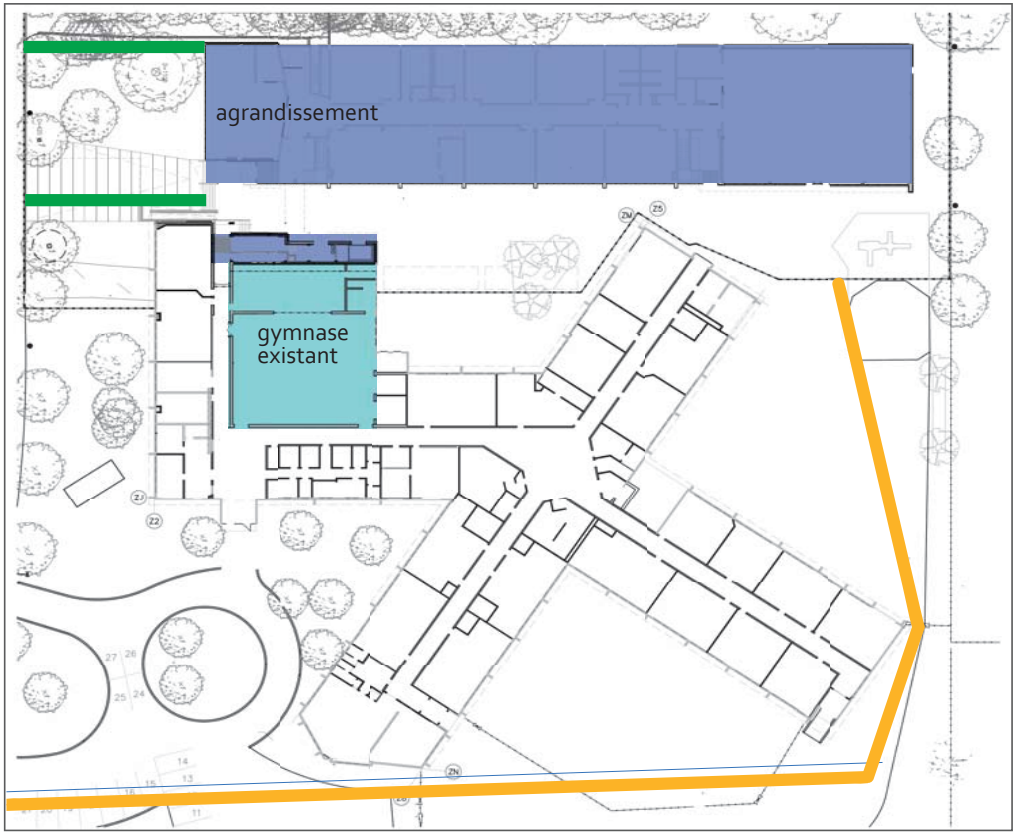

PROVENCHER_ROY Stantec sdk

mai 2019
